

POROČILO O DELOVANJU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO

ZA MESEC MAREC 2025




NEK je v marcu proizvedla 547 156,63 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 520 951,62 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,16 % večja od načrtovane (515 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Diagram obratovanja NEK za mesec marec 2025

Proizvedena energija na generatorju: 547156,63 MWh
Proizvedena energija na pragu: 520951,62 MWh

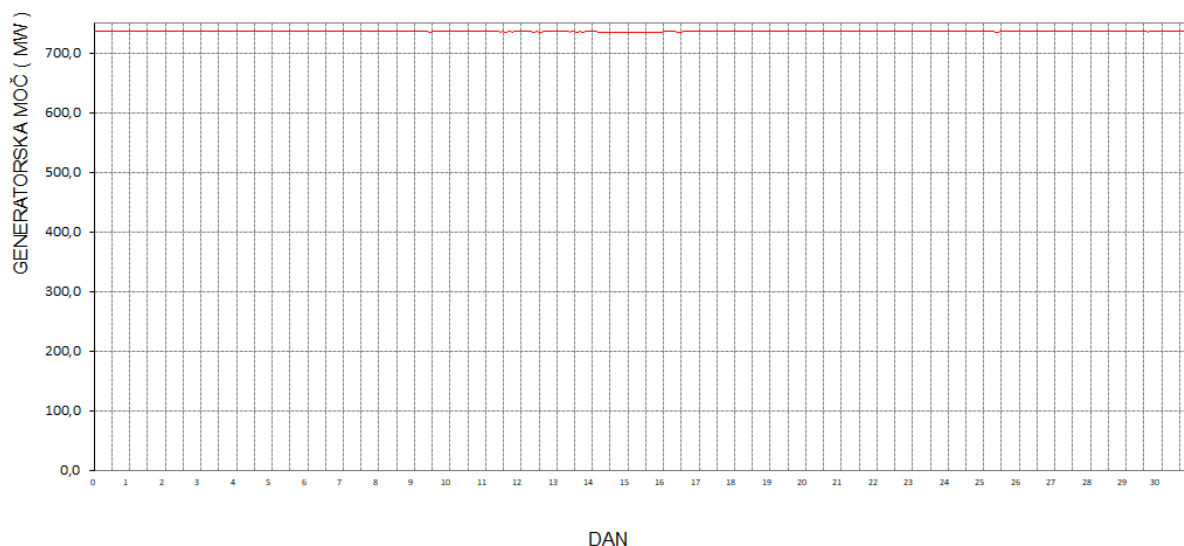

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,2 °C in največ za 2,5 °C od dovoljenih 3 °C.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 4,45 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 8,22 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,002 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,004 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 µSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,49 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 3,3 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
